


Rivning av Greningen Nedre



- Litet bidrag till kraftproduktionen
- Stort renoveringsbehov som ej är ekonomiskt försvarbart






Sättar (som slipers)
som en och en lyfts
bort manuellt under
drygt två veckors tid

Botten-
utskov



- Rivningen av utskovet påbörjades 1:a maj 2023.
- Tidskrävande och fysiskt
- Krav på begränsad sänkingshastighet med tanke på fisk

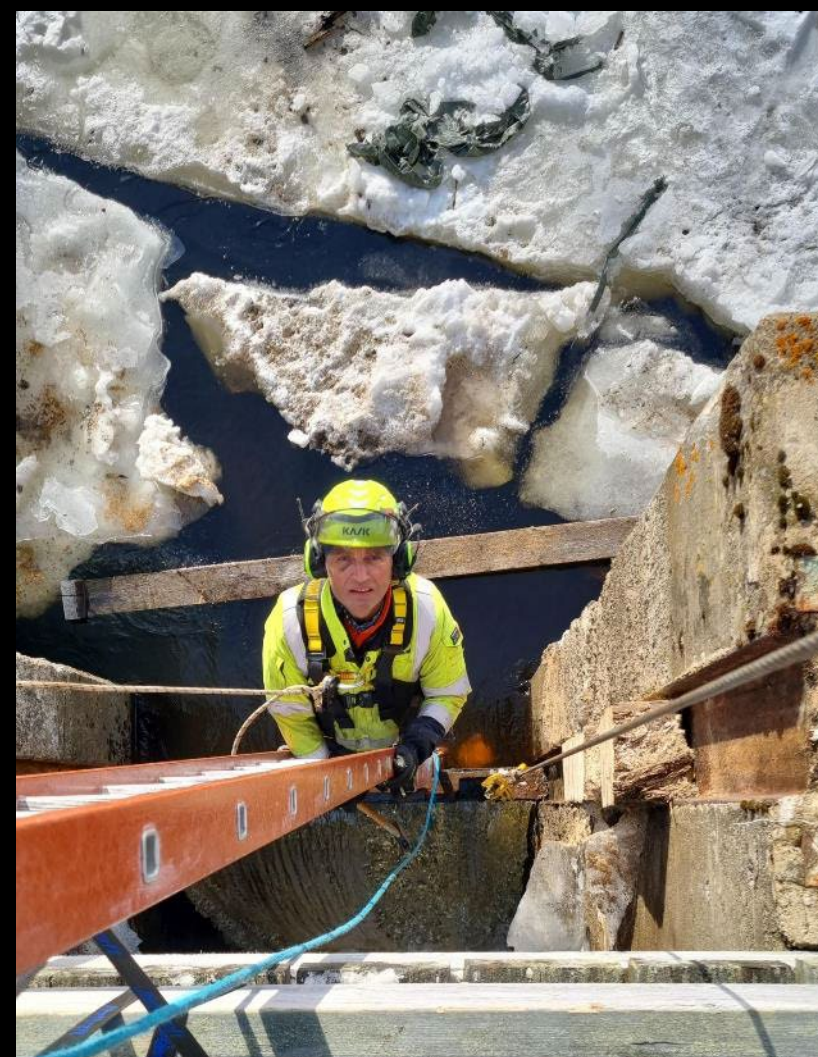



Slutet av maj 2023



Juni 2023

A wide river with a low water level, rocky banks, and a dam in the foreground. The river flows from the background towards the foreground, where it is partially blocked by a concrete dam. The water is clear and reflects the sky. The banks are covered in rocks and patches of green moss or algae. In the background, there are dense evergreen forests and distant mountains under a blue sky with light clouds. A red boat is visible on the left bank. The overall scene is a natural, scenic landscape.

Augusti 2023

A photograph of a rocky, grassy slope. The foreground is dominated by large, flat, grey and brown rocks scattered across a field of green grass with small yellow flowers. The slope rises towards the background, where a small, simple wooden structure with a metal frame is visible. The background is filled with dense green trees and foliage under a clear sky.

Augusti 2023,
innan rivning

Vänster fyllnadsdamm

Ny tröskel i
bergskärning



Slutet av September 2023





Greningsvågen

Kvarnån till Åreälven

FORSA
4:1>6

FORSA 4:1>3



Kvarnån till Åreälven

Gammal bäck som
behållit sin form trots
100 års dämning

Utskov Greningen övre



Fortsatta arbeten

- Finjusteringar och andra efterarbeten
- 5-års uppföljning av vegetationsetablering
